

SND 2회차 컨설팅 실행안

현장업무 자동화 우선과제와 통합 Dashboard 초안

생산실적 자동집계 · 공정 진행 가시화 · 품질/불량 분석 · 보고 자동화

SESSION FOCUS

진단 반복이 아니라 실행 범위를 결정하는 회차

- MVP 범위 확정
- 역할별 KPI 정의
- 데이터 기준 컬럼 합의
- PoC 일정과 담당 정리

SND는 이제 '무엇을 자동화할지'보다 '어디부터 연결할지'를 정해야 합니다

회사/공정 맥락

항공·방산 부품 가공과 치공구 제작

주요 공정: MCT / Router / Forming /

Deburring / 검사

2026년 MES 구축 예정, 현장 데이터는

아직 수기·엑셀 의존 구간 존재

이번 회차에서 확인할 핵심

과제

- 생산실적 취합과 보고가 반복 업무로 남아 있음
- 공정 지연과 병목을 한 화면에서 보기 어려움
- 불량·재검·품질문서 이력이 작업번호 기준으로 이어지지 않음

관리팀

실적 취합·KPI
산출·경영보고
작성시간 과다

생산팀

작업진행·지연·설비
정지를 즉시 보기
어려움

품질팀

검사·불량·재검
데이터가 분산되어
패턴 분석 지연

공통

MES, 문서, 사진,
이력정보를 같은
번호로 엮어야 함

2회차에서 합의할 MVP는 세 갈래면 충분합니다

처음부터 전사 통합이 아니라 실적·공정·품질의 연결부터 시작합니다

TRACK 1

생산실적 자동집계

- 일/주/월 실적 자동 집계
- 생산계획 대비 완료율 계산
- 경영보고용 요약 표 자동 생성

TRACK 2

공정 진행 / 병목 모니터링

- MCT·Router 작업현황 한눈에 조회
- 지연 작업과 설비 정지 이력 표시
- 계획 대비 실제 작업시간 비교

TRACK 3

품질 / 불량 분석

- 불량유형 TOP과 공정별 불량률 집계
- 재검 이력 연결과 반복불량 파악
- FAI·검사성적서 검색 시간 단축

세 트랙 모두 공통키는 '작업번호 / 품목번호'입니다

이 키가 잡혀야 실적, 공정, 검사, 문서, 사진을 하나의 이력으로 연결할 수 있습니다.

데이터는 복잡하게 모으기보다 '작업번호 중심 한 줄 이력'으로 시작하는 편이 빠릅니다

최소 공통
컬럼



이 구조면 추후 AI 요약이나 원인분석도 같은 테이블을 기반으로 확장할 수 있습니다.

Dashboard는 역할마다 질문이 달라야 합니다

경영자는 요약, 실무자는 상세, 품질은 원인과 이력까지 내려가도록 구성합니다

경영자 화면

한 페이지 KPI 요약

- 생산완료율
- 납기준수율
- 불량률
- 설비가동률
- 위험 알림

관리팀 화면

계획 대비 실적과 보고 자동화

- 고객/품목별 납기위험
- 일·주·월 실적
- 부서별 진행률
- 보고서 초안

생산팀 화면

MCT·Router·공정 진행

- 작업현황
- 지연작업
- 설비정지
- 병목공정
- 계획 vs 실제 시간



품질팀 화면

불량·재검·문서 이력

- 검사건수
- 불량유형 TOP
- 재검현황
- 공정별 불량률
- FAI 진행현황

Prototype KPI 화면은 숫자·위험 신호·추세를 함께 보여줘야 합니다

아래 수치는 실제 연동 전 레이아웃 검토용 예시입니다

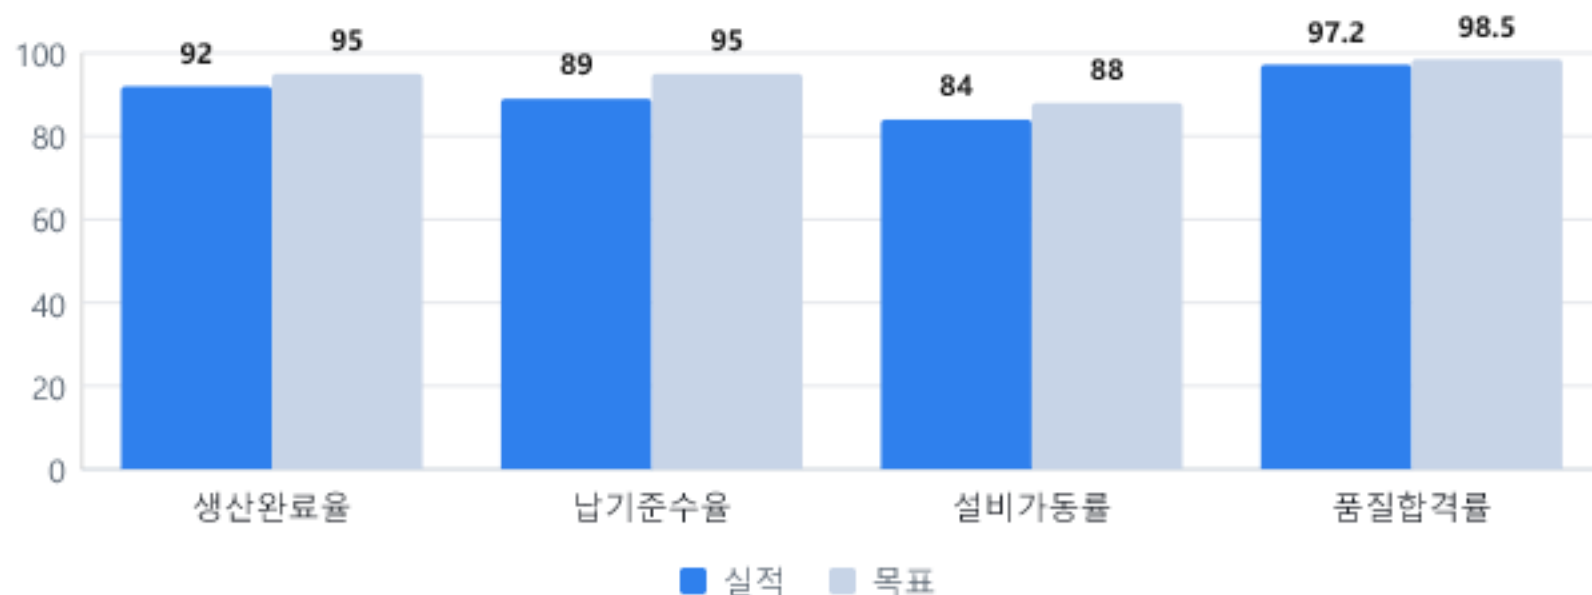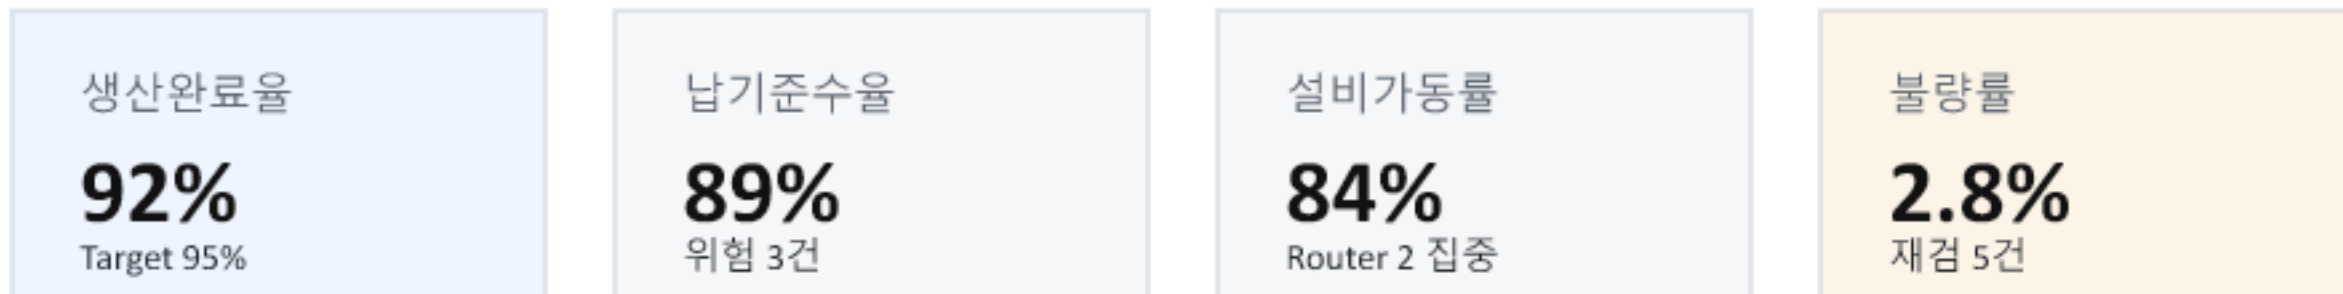

이번 주 이상 징후	
납기 위험	3건
병목 공정	Router 가공
반복 불량	치수 편차
우선 조치	재배치 권고

PoC는 4단계로 끊어야 검증과 투자판단이 쉬워집니다

실행 순서는 데이터 정리 → 화면 구성 → 자동화 → AI 보조기능 순서가 적절합니다

1. 데이터 정리

Week 1-2

- 기초 컬럼 확정
- 작업번호 기준 연결
- 누가 입력/검토할지 지정

2. Dashboard MVP

Week 3-5

- 경영/관리/생산/품질 화면
- 실적 자동 집계
- 지연/불량 Drill-down

3. 보고 자동화

Week 6-8

- 일·주간 보고 초안
- 경영요약 문안 자동생성
- 품질요약 템플릿

4. AI 보조기능

Week 9-10

- KPI 변동원인 요약
- 반복불량 탐색
- 지연작업 설명 보조

10주 안에 '보는 화면'과 '자동 집계되는 흐름'까지 검증하면 성공적인 1차 PoC로 볼 수 있습니다.

오늘 최종적으로 정리해야 할 것은 기능보다 운영 방식입니다

이 세 가지만 확정되면 이후 구축과 테스트가 훨씬 빨라집니다

1. 범위

첫 MVP에 넣을 데이터와 화면을 어디까지 볼지

2. 책임

누가 입력하고 누가 검토·승인할지

3. 기준

매일 볼 KPI와 이상 판단 기준을 무엇으로 둘지

권장 즉시 액션

- 작업번호 기준 샘플 데이터 2~4주치 확보
- 관리팀/생산팀/품질팀 담당자 1명씩 지정
- 일일 KPI와 주간 보고 항목 분리
- 문서·사진 파일명 규칙 통일
- Dashboard MVP 화면 검토 후 자동화 우선순위 확정

Closing

SND가 바로 시작할 수 있는 수준의 실행안으로 좁히는 것이 2회차의 목적입니다.
